

Протокол о результатах преддоговорных переговоров

№ 2012.0885(32354)/8

18.02.2013 г.

город 628403, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. 30 лет Победы, д. 34, каб. №407

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (628403, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4.), далее «Организатор конкурса», в лице заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Буткевича Виталия Федотовича, действующего на основании доверенности от 30.11.2012 г. № 07/12-190, и

Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» (454119, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2, офис 410), далее «Победитель конкурса», в лице директора Панова Сергея Викторовича, действующего на основании устава общества, подписали настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров о нижеследующем:

1. Организатор конкурса объявил открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Заходы ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, извещение о котором было опубликовано на Торговой площадке Системы www.b2b-mrsk.ru.

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии (протокол №2012.0885(32354)/5 от 11.02.2013 г.) Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» было определено Победителем конкурса, поскольку предложил наилучшие условия поставки продукции. Цена: 13 900 497,25 руб. (Цена с НДС).

3. В связи с тем, что фактическая дата подведения итогов конкурса, по объективным причинам, позже установленной в Извещении о проведении конкурса (27.12.2012 г. – дата подведения итогов согласно Извещению о проведении конкурса; 11.02.2013 г. – фактическая дата подведения итогов конкурса) на основании п. 3.16 конкурсной документации, необходимо провести с победителем конкурса ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго» стороны провели преддоговорные переговоры, направленные на уточнение фактических сроков начала и окончания выполнения работ по договору.

4. Установить начальный срок выполнения работ по Договору 18.02.2013 г. Конечный срок выполнения по Договору 25.12.2013 г. Промежуточные сроки выполнения работ по каждому этапу указаны в Календарном плане, приложение 1 к настоящему протоколу о результатах преддоговорных переговоров.

5. Сроки выполнения работ по этапам 3 «Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и 5 «Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы» не входят в общие сроки выполнения проектно-изыскательских работ.

6. Выполнение работ по этапу 3 «Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» должно быть завершено в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания выполнения работ по этапу 2 «Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации».

7. Выполнение работ по этапу 5 «Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы» должно быть завершено в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания выполнения работ по этапу 4 «Рабочая документация».

1


Договор
Филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

отправлено: 18.02.2013, 14:00
от: Комиссия по закупкам
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

8. Остальные договорные условия выполнения работ, не затронутые настоящими переговорами, остаются в неизменном виде.

9. Настоящий протокол о результатах преддоговорных переговоров составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (628403, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4.)



В.Ф. Буткевич

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» (454140, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2, офис 401)



С.В. Панов

Начальник юридического отдела
ООО «АСП» холдинг «РосЭнерго»
А.С. Худышкин

Договор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети
--	--

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнения проектных и изыскательских работ
по объекту «Заходы ВЛ 110 кВ Сургут – Имплор» для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

№ этапа работ	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ	Стоимость в текущих ценах с НДС 18%, рублей	Финансирование по договору в текущих ценах с НДС 18%, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Проектная документация, в том числе:	18.02.2013г.	15.10.2013 г.	9 176 909,51	5 964 991,18
1.1	Обследование объекта, сбор исходных данных. Выбор и согласование трассы заходов ЛЭП 110 кВ. Оформление и согласование (утверждение) акта выбора земельного участка под строительство, межевание земельного участка, оформление права на земельный участок для реконструкции.				
	Утверждение проекта межевания и планировки территории.				
1.2	Комплексные инженерные изыскания трассы заходов ЛЭП 110 кВ				
1.3	Общая пояснительная записка и основные чертежи				
1.4	Электротехническая часть				
1.5	Заход ЛЭП 110 кВ, ВОЛС				
1.6	Сборник спецификаций оборудования				
1.7	Организация эксплуатации ЛЭП-110 кВ и ВОЛС				
1.8	Проект организации строительства				
1.9	Охрана окружающей среды				
1.10	ИТМ ГО МЧС				
1.11	Оценка экономической эффективности				

3

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети


1.12	Работы на смежных объектах				
1.13	Сводный сметный расчет стоимости строительства				
2	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектной документации.	16.10.2013г.	10.11.2013г.	---	---
3	Получение Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации в результатов инженерных изысканий.	11.11.2013г.	В течение 60 (шестидесяти) дней с даты согласования ИД Заказчиком	997 172,20	648 161,93
4	Рабочая документация.	11.11.2013г.	25.12.2013г.	3 726 415,54	2 422 170,10
5	Проведение Заказчиком ведомственной экспертизы проектно-сметной документации. Внесение Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию по результатам экспертизы.	26.12.2013г.	23.02.2014г.	---	2 780 099,45
	Аванс по Договору				2 085 074,59
	Всего по договору с НДС			13 900 497,25	13 900 497,25

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (628403, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4.)



В.Ф. Буткевич

Общество с ограниченной ответственностью «АруСтройПроект» филиал «РосЭнерго» (644149, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 2, офис 410)

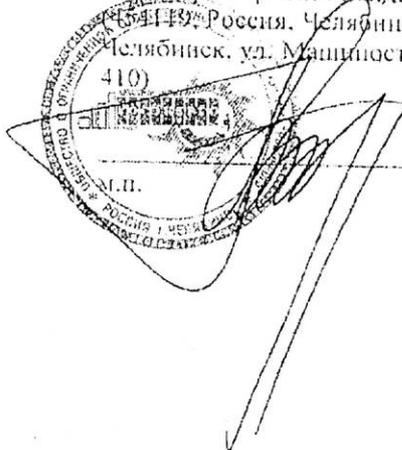

С.В. Панов

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

4

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети
