

Договор №806/11-12

на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т
ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

г. Сургут

15 мая 2012 года

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Бурки Александра Эвалдсовича, действующего на основании доверенности от 01.12.2011г. № 07/11-88, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «ТЭСС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-СУРГУТ» Полторакова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности от 10.06.2011г. за № Д-69/11, с другой стороны, на основании протокола заседания закупочной комиссии по выбору подрядчика №ЗЕИ(275)/1 от 26.04.2012 года (Приложение № 3 к настоящему договору), заключили настоящий договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (далее - Филиал), а Заказчик обязуется своевременно принять и произвести оплату выполненных работ в полном соответствии с условиями договора.

1.2. Наименование и иные сведения об объекте, содержание и сроки выполнения работ по договору, приведены в Приложение №1 к настоящему договору.

2. Стоимость работ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, представлена в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет 4 304 313,84 рублей (четыре миллиона триста четыре тысячи триста тринадцать рублей 84 копейки), кроме того НДС по ставке 18% - 774 776,49 рублей (семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 49 копеек). Итого с НДС (18%) – 5 079 090,33 рублей (пять миллионов семьдесят девять тысяч девяносто рублей 33 копейки).

2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. договора, включает в себя все затраты на выполнение Подрядчиком работ, в соответствии с условиями договора, в т.ч. затраты на приобретение и доставку материалов к месту проведения работ, запасных частей, комплектующих и необходимой техники, а так же командировочные расходы, подготовку рабочего места и допуск.

3. Условия платежей и порядок расчета

3.1. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы за минусом штрафных санкций, в случае их предъявления и признания Подрядчиком, либо взыскание в судебном порядке.

3.2. Основанием для осуществления платежей является:

- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г №100);
- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г №100);

- подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты по форме ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных основных средств» на соответствующие виды работ с предоставлением копий счетов-фактур и накладных, подтверждающих стоимость ТМЦ, используемых при выполнении аварийно-восстановительных работ на объекте основных средств. В случае несоответствия цены ТМЦ, указанных в актах на выполнение аварийно-восстановительных работ. Подрядчик дополнительно предоставляет копии первичных документов (приходный ордер или иной бухгалтерский документ);
- расчет транспортных услуг с предоставлением справки-подтверждения транспортных расходов;
- счет на оплату;
- счет – фактура.

3.3. Подрядчик должен представить Заказчику документы подтверждающие выполнение работ (Акты по форме КС-2, Справка о выполненных работах КС-3, Акт формы ОС-3) и исполнительную документацию на завершённые в отчетном периоде работы не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

3.4. Подрядчик должен подтвердить командировочные расходы копиями авансового расчета с приложением всех необходимых документов, заверенных руководителем предприятия.

3.5. Заказчик подписывает документы, указанные в п. 3.2 в течение пяти рабочих дней или предоставляет письменный мотивированный отказ.

3.6. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ не позднее 5 дней, после получения подписанных со стороны Заказчика Актов о приемке выполненных работ. Во избежание разногласий о сроках предоставления документов, дата получения фиксируется Сторонами входящим номером на сопроводительном письме. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры.

3.7. Ненадлежащее оформление Подрядчиком счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за просрочку оплаты по Договору.

3.8. Оплата по договору производится не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.9. При оплате денежными средствами, обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания акта приема-передачи векселей, либо дата подписания иных документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете).

4. Срок выполнения работ

4.1. Начальный срок выполнения работ по договору: 15.05.2012 г.

4.2. Конечный срок выполнения работ по договору: 31.05.2012 г.

4.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке, по соглашению сторон, а так же в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. При исполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить:

- производство аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД, СНИПы, циркуляры и др.), действующей на период производства работ.
- устранение недостатков и дефектов, выявленных на объекте Заказчика при приемке работ в сроки, согласованные с представителем Заказчика.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.1.3. Обеспечить соблюдение своим персоналом:

- Правил внутреннего трудового распорядка филиала Сургутские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго»;
- Положения ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза»;
- Инструкции филиала Сургутские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго» «Правила обращения с отходами»;
- Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ -016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);
- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);
- Другой нормативно-технической документации действующей на территории РФ.

Не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

5.1.4. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.5. В течение 3 календарных дней после подписания настоящего договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику.

5.1.6. Организовать планирование и координирование всех этапов работ договора.

5.1.7. Осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, Субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

5.1.8. Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

5.1.9. Обеспечить объект в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ.

Подрядчик представляет Заказчику следующие подтверждающие документы на материалы, используемые при выполнении аварийно-восстановительных работ:

- Сертификаты соответствия;
- Счета-фактуры.

5.1.10. Немедленно известить представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.11. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных настоящим договором.

5.1.12. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта.

5.1.13. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Представителю Заказчика запасных частей, оборудования и

материалов. Он также осуществляет входной контроль и обеспечение необходимого качества при хранении материальных ресурсов, переданных Заказчиком.

5.1.14. Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье: лом цветных, черных металлов, отработанное трансформаторное масло принадлежит Заказчику. После выполнения работ Подрядчик передает Заказчику на центральный склад, либо в иное место, указанное Заказчиком, демонтированное оборудование, запасные части, отработанное трансформаторное масло, а также лом цветных и черных металлов, образовавшиеся в результате ремонта и (или) демонтажа электротехнического оборудования, на основании Акта приема-передачи вторсырья, форма которого предусмотрена Приложением № 7 к настоящему договору и подписанного Сторонами. Трансформаторное масло передается заказчику в герметичной упаковке (бочка емкостью 160-250 л), исключающей разлив.

5.1.15. В течение 7 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.1.16. Немедленно известить Представителя Заказчика о независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок, а так же в случае обнаружения непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, а также приостановить работы, до получения от него письменных указаний.

5.1.17. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего договора информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты заключения настоящего дополнительного соглашения; выписка из реестра акционеров, выданная не позднее последнего дня месяца, предшествовавшего месяцу, в котором заключается настоящее дополнительное соглашение; паспорт гражданина, протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) об избрании исполнительного органа), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

5.1.18. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписка из реестра акционеров; паспорт гражданина; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ N 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

5.2. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении договоров с Субподрядчиками.

5.3. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также персонал привлеченных

им субподрядных организаций, выполняющих работы на объекте ОАО «Тюменьэнерго» со следующими документами:

- «Памятка для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов» (Приложение № 4 к настоящему договору).

- «Перечень потенциальных опасностей на рабочих местах ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 5 к настоящему договору);

- Перечень потенциальных опасностей при выполнении работ на ВЛ и ПС ОАО «Тюменьэнерго» (Приложение № 6 к настоящему договору).

Подрядчик должен предоставить Заказчику письменный отчет об осведомленности своего персонала, а также об осведомленности своих субподрядчиков, выполняющих работы на объекте ОАО «Тюменьэнерго», с вышеуказанными документами в срок не позднее трех дней с даты заключения настоящего договора.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1. Осуществить финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в течение всего периода ведения работ в соответствии со статьями 2 и 3 настоящего договора.

6.1.2. В течение 3 календарных дней после подписания настоящего договора, назначить своих представителей - супервайзеров, уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения технической части настоящего договора.

6.1.2.1. Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего договора и Положением ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза».

6.1.3. Производить допуск Подрядчика и его подрядных организаций для выполнения обязательств, принятых, по настоящему договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ на действующем энергетическом оборудовании и в соответствии с правилами внутри объектного режима Заказчика.

6.1.4. Обеспечить режимы работы оборудования, находящегося в эксплуатации для выполнения Подрядчиком работ по договору, не вступая в противоречие с диспетчерской дисциплиной.

6.1.5. Обеспечить, по возможности, Подрядчика электроэнергией в пределах существующей стационарной разводки в зоне выполнения работ по договору.

6.1.6. Обеспечить Подрядчика актами обследования и данными по состоянию оборудования перед выполнением работ по договору.

6.1.7. Заполнять и своевременно выдавать Подрядчику наряды на огневые работы при работах в электроустановках Заказчика.

6.1.10. Обеспечивать расчистку подъездных и внутриподстанционных дорог в зимний период.

6.1.11. В течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика Актов приемки выполненных работ формы КС-2 рассмотреть их, подписать или направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

6.1.12. Обеспечить квалифицированным эксплуатационным персоналом проведение пусковых операций на оборудовании и ввод его в работу после выполнения Подрядчиком аварийно-восстановительных работ.

6.1.13. Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения работ в соответствии с действующими нормативными техническими документами.

6.2. Для реализации настоящего договора Заказчик вправе:

6.2.1. На любом этапе производства работ проверить соблюдение технологии выполнения

работ по договору и при обнаружении нарушений остановить их и потребовать выполнения работ в соответствии с нормативно-технической документацией. Все распоряжения и указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, должны быть оформлены в письменном виде.

6.2.2. Отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Заказчика (далее - Уведомление), если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика. Упущенная выгода при этом не возмещается.

6.2.2.1. Подрядчик обязан прекратить выполнение работ по настоящему договору с момента получения Уведомления, а также в течение 3 (трех) дней с даты получения Уведомления вывезти с территории выполнения работ принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, материалы и другое имущество.

6.2.2.2. В течение 5 (пяти) дней с даты получения Уведомления Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ, фактически выполненных на дату получения Подрядчиком Уведомления (далее - Акт). Одновременно с Актом Подрядчик направляет в адрес Заказчика перечень имущества (оборудование, материалы и т.п.), приобретенного Подрядчиком в целях исполнения обязательств по настоящему договору, с указанием основных характеристик имущества (в том числе, но не ограничиваясь, наименования, ассортимента, срока изготовления), цены приобретения.

6.2.2.3. В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика Акта Заказчик подписывает Акт и возвращает Подрядчику один его экземпляр, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

7. Сдача-приемка работ

7.1. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом формы ОС-3 «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных основных средств», с приложением акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3.

7.2. При выполнении работ оборудование передается Подрядчиком Заказчику по накладной, формам ОС-14 (Акт о приеме - поступлении оборудования на склад) и ОС 15 (акт о приеме - передаче оборудования в монтаж). В течение 5 дней после подписания формы ОС-14, ОС-15 Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую требованиям ст. 169 НК РФ.

7.3. Результаты работы Подрядчика, в которых представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика.

7.4. Подрядчик предварительно информирует Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5. По окончании работ Подрядчик оформляет Акт приемки оборудования из ремонта (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему договору), производит запись в журнале ввода оборудования, журнале релейной защиты и автоматики и передает весь объем хранившейся у него документации Заказчику. Заполнение паспортов оборудования выполняет Заказчик.

7.6. Акты приемки оборудования из ремонта и паспорта на оборудование Подрядчик передает Представителю Заказчика в срок не позднее чем через семь календарных дней после окончания работ в отношении соответствующего Объекта. Представитель Заказчика заполняет сведения о выполнении аварийно-восстановительных работ в паспорте оборудования. Документацию необходимую для работы приемочной комиссии, согласно утвержденному Заказчиком перечню, Подрядчик предоставляет не позднее срока окончания аварийно-восстановительных работ соответствующего объекта.

8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
- качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, государственными стандартами, техническими условиями;
- наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых Подрядчиком для выполнения работ.

8.2. Гарантии качества распространяются на используемые Подрядчиком при производстве работ материалы, запасные части на все конструктивные элементы, а также на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, в течение 12 месяцев со дня приемки результата работ в целом.

При обнаружении недостатков в выполненной работе гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8.3. При обнаружении недостатков в выполненной работе, обнаруженных в ходе приемки работ или в период гарантийного срока, а также при выявлении факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стороны подписывают акт, фиксирующий выявленные недостатки и сроки их устранения.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.

Если Подрядчик не предоставит свои замечания по представленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в работе в течение 10 дней с момента получения от Заказчика уведомления об обнаружении недостатков в результатах работ, акт считается принятым в редакции Заказчика.

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ. В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения документов, подтверждающих затраты Заказчика, вызванные указанным обстоятельством.

9. Ответственность

9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости

невыполненных работ, за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

9.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в результатах работы в ходе ее приемки, а также в период срока гарантии на выполненный результат работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить недостатки в работе за свой счет.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком при выполнении работ некачественных материалов и их комплектующих, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, стоимость работ с использованием таких материалов, уменьшается на стоимость некачественных материалов.

9.5. Если после оплаты Заказчиком выполненных работ обнаружатся недостатки в выполненных работах, либо факт использования некачественных материалов, либо не соответствующих сертификатам соответствия, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штраф в размере, указанном в п. 9.3. и (или) денежную сумму, составляющую разницу стоимости работы, определенной по п. 9.4. настоящего договора и фактически уплаченными денежными средствами за данную работу из стоимости следующего этапа работ по данному или иному договору, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика, либо взыскать в судебном порядке.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на объекте Заказчика работниками Подрядчика, работниками других организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору правил и норм по технике безопасности, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом, фиксирующим нарушение, составленным и подписанным уполномоченным лицом Заказчика.

9.7. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по договору, в том числе обязательств, предусмотренных пунктами 5.1.17, 5.1.18 настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (договор считается расторгнутым с момента получения уведомления Заказчика, если иной более поздний срок не указан в уведомлении о расторжении договора, либо с момента получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику месту нахождения Подрядчика) и взыскать с Подрядчика убытки, понесенные Заказчиком в связи с расторжением договора и привлечением для выполнения работ нового Подрядчика, а также упущенную выгоду, рассчитанные на основании калькуляции Заказчика, других документов, подтверждающих убытки Заказчика. В случае одностороннего отказа от исполнения договора по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору Заказчик вправе оплатить расходы Подрядчика за вычетом штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

9.8. При неисполнении/ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по договору, в том числе при расторжении Заказчиком договора в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости невыполненных/ненадлежащим образом выполненных работ. При этом Заказчик вправе удержать сумму штрафа из стоимости надлежаще выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, подлежащих оплате.

9.9. В случаях нарушения Подрядчиком норм действующего законодательства Российской Федерации при выполнении работ взыскания, налагаемые на Заказчика уполномоченными надзорными органами РФ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента предоставления Заказчиком документов, свидетельствующих об уплате

взысканных сумм. Факт нарушения устанавливается подписанием акта, фиксирующего нарушения представителями Заказчика, Подрядчика и надзорного органа.

9.10. Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб согласно действующему законодательству Российской Федерации.

9.11. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Заказчику комплектующих и материалов.

10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по договору, а именно: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, срок исполнения обязательств отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

10.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

13. Дополнительные условия

13.1. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Заказчику оформляется трехсторонним договором.

13.2. Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы уполномоченными представителями сторон и оформлены дополнительным соглашением.

13.3. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон по договору.

13.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 дней с даты ее получения.

13.5. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат, по выбору истца, разрешению в Третьей инстанции при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третьей инстанции при НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются обязательными и оспариванию не подлежат.

13.6. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов.

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.8. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14. Приложения к договору

14.1. Приложение № 1 – Наименование объекта, содержание и сроки выполнения аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

14.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

14.3. Приложение № 3 – Копия протокола заседания закупочной комиссии №ЗЕИ(275)/1 от 26.04.2012 года;

14.4. Приложение № 4 - Копия «Памятки для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов»;

14.5. Приложение № 5 - Перечень потенциальных опасностей на рабочих местах ОАО «Тюменьэнерго»;

14.6. Приложение № 6 – Перечень потенциальных опасностей при выполнении работ на ВЛ и ПС ОАО «Тюменьэнерго».

- 14.7. Приложение № 7 – Форма акта приема-передачи вторсырья;
14.8. Приложение № 8 – Форма акта на приемку из ремонта оборудования.

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

15.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга.


15.2. Реквизиты и подписи Сторон:

От Заказчика:

ОАО «Тюменьэнерго»
Место нахождения Общества: Россия,
г. Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра,
ул. Университетская, 4
Почтовый адрес Общества: 628406, Россия,
г. Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра,
ул. Университетская, 4
Филиал Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго» Сургутские электрические
сети (филиал ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети)
Местонахождение/ почтовый адрес филиала:
628403, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 34,
тел. (3462) 773329, факс (3462) 243178
ИНН 8602060185, КПП 860203001,
ОГРН 1028600587399, ОКПО 00108430
Р/с 40702810067170003813
В Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк
России» г. Тюмень
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

От Подрядчика:

Открытое акционерное общество «ТЭСС»
Юридический адрес: 628406, Российская
Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, Пролетарский
проспект, дом 11
Почтовый адрес: 628408, Россия, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут-8, а/я 2080
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 8603115133 / 860 201 001,
ОГРН 1048600507757
Р/с 407 028 109 671 700 033 08 в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк России»
г. Тюмень,
К/с 301 018 108 000 000 006 51,
БИК 047102651
ОКАТО – 71136000000; ОКВЭД – 40.10.5;
ОКПО – 73151408; ОКОГУ – 49014
Исполнитель работ:
Филиал ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-СУРГУТ»
Местонахождение:
628403, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, улица 30 лет Победы, дом 34
Почтовый адрес: 628403, Российская
федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут-3, а/я 98
Тел./факс (3462) 77-42-59 / 77-42-69
e-mail: Sg@oao-tess.ru



Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети
А.Э. Бурка

Директор филиала
ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-СУРГУТ»
А.В. Полтораков



согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

**Наименование объекта, содержание и сроки выполнения аварийно-восстановительных работ по замене трансформатора 1Т ПС «Ключевая» филиала
ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети**

1. Перечень объектов, на которых необходимо выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ :


№	Наименование РЭС	Местонахождение РЭС	Наименование ПС	Год ввода	Класс напряжения	Расстояние до объекта от филиала ТЭ	Расстояние до объекта от РЭС	Транспортная схема		
								Земли, км	Грунтовая дорога, км	Дорога с твердым покрытием, км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЛРЭС	г.Лянтор								
			ПС Ключевая	1989	110/35/6	132,5	32,5			да

2. Объем выполняемых работ:

№	Наименование РЭС	Наименование ПС	Диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования	Тип ремонтируемого оборудования	Вид работ	Срок выполнения работ (квартал)	Требования к работам
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ЛРЭС						
		ПС Ключевая	1Т	ТДПН-25000/110	АВР	2	Работы выполнять согласно Акта технического обследования оборудования перед ремонтом и Ведомости объемов работ



От Заказчика:

Директор
филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Сургутские электрические сети
М.И. Бурка



Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети



Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Аварийно-восстановительный ремонт. Замена трансформатора типа ТДН-110 на ПС Ключевая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ руб. 5 079 090,330 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. мех. Всего		
					Всего			В том числе			Всего			В том числе				Т/з осн. мех. на ед.	
					Осн.	Эк.	Мат	Осн.	Эк.	Мат	Осн.	Эк.	Мат	Осн.	Эк.	Мат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Раздел 1. Разборка навесного оборудования аварийного трансформатора инв. № 24716																			
1	ЕРро 48-01-007-001	Подготовительные работы	трансформатор	1	3065,28	3065,28				3065,28	0	0	0	0	32	32			0
2	ЕРро 48-01-007-004	Расшиновка трансформатора	трансформатор	1	1189,68	1189,68				1189,68	0	0	0	0	12	12			0
3	ЕРро 48-01-007-005	Слив масла	трансформатор	1	940,77	871,39	69,38			940,77	871,39	69,38	0	0	9,6	9,6			0
4	ЕРро 48-01-007-007	Снятие вводов	трансформатор	1	11015,97	1546,58	9469,39	1757,79		11015,97	1546,58	9469,39	1757,79		15,6	15,6			10,92
5	ЕРро 48-01-007-008	Разборка системы охлаждения	трансформатор	1	8663,67	1724,22	6939,45	1287,76		8663,67	1724,22	6939,45	1287,76		18	18			8

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Согласовано: секретарь конкурсной/аспектальной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

6	ЕРро 48-01-007-006	Снятие расширителя и арматуры	1 трансформатор	1	2301	306,53	1994,47	370,23	1994,47	306,53	370,23	3,2	3,2	2,3	2,3
7	ЕРро 48-01-057-026	Снятие термосигнализаторов, манометров	1 трансформатор	1	128,61	128,61		0	0	128,61	0	1,5	1,5	0	0
8	ЕРро 48-01-007-002	Снятие трансформатора на фундаменте	1 трансформатор	1	317,24	317,24		0	0	317,24	0	3,7	3,7	0	0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2011г.															
Производство ремонтных работ вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне ЛЭП ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ЗПМ=1,2 (Поз. 1-8)															
Итого															
Территориальный коэффициент ЭМ=1,24; МАТ=1,13 (Поз. 1-8)															
Итого															
Районный коэффициент ОЗП=70%; ЗПМ=70% (Поз. 1-8)															
Северная надбавка ОЗП=50%; ЗПМ=50% (Поз. 1-8)															
Итого прямые затраты по 3 зоне															
Итого															
Накладные расходы															
140% ФОТ															
Сметная прибыль															
40% ФОТ															
Итого по разделу 1 Разборка навесного оборудования аварийного трансформатора в ценах 2012 г.															
Раздел 2. Погрузка, разгрузка, перевозка, аварийного трансформатора инв. № 24716 с ПС Ключевая на базу СПП															
9	Аренда	Кран 80 т	маш/час	28	34000										
10	Аренда	Трал	маш/час	28	18000										
Итого по разделу 2 Погрузка, разгрузка, перевозка, аварийного трансформатора с ПС Ключевая на базу СПП															
Раздел 3. Сборка на базе СПП резервного трансформатора инв. № 24679 для проведения испытаний															
11	ЕРро 48-01-007-001	Подготовительные работы	1 трансформатор	1	3065,28	3065,28			0	3065,28	0	32	32	0	0
12	ЕРро 48-01-007-017	Сборка системы охлаждения и установка арматуры (в т.ч. расширителя)	1 трансформатор	1	10971,42	3370,76	6937,28	1287,76	6937,28	10971,42	1287,76	34	34	8	8
13	ЕРро 48-01-056-002	Снятие и установка привода переключающего устройства РПН	1 привод	1	1328,83	1328,83				1328,83	0	10,8	10,8	0	0
14	ЕРро 48-01-007-018	Герметизация активной части	1 трансформатор	1	27684,55	4907,43	20031,4	3718,41	20031,4	27684,55	3718,41	49,5	49,5	20,8	20,8

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Раздел 8. Погрузка, разгрузка, перевозка, установка резервного трансформатора инв. № 24679 с базы СПП на ПС Ключевая

37	Аренда	Кран 80 т	маш/час	28	34000				952000			
38	Аренда	Трал	маш/час	28	18000				504000			
Итого по разделу 8 Перевозка резервного трансформатора с базы СПП на ПС Ключевая										1456000		
Раздел 9. Доставка бригады, командировочные расходы												
39	тарифы п. 14	УРАЛ-42112 вахта дл. 8,3 м 120 км*2 (туда и обратно) /49км.час=4,9 часа	маш/час	4,9	992,37				4862,61			
40		Командировочные 6 чел.х 6 дней=36 дней	сут.	36	400				14400			
Итого по разделу 9 Доставка бригады, командировочные расходы:										19262,61		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2012г.										4 304 313,84		
НДС 18%										774 776,49		
ВСЕГО по смете										5 079 090,33	1507,52	145,60

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)


Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Договор
филиала ОАО «Томьэнерго»
Сургутские электрические сети

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Томьэнерго»
Сургутские электрические сети

ПОДПИСИ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель Закупочной комиссии



Бурка А.Э.

Зам. председателя Закупочной комиссии




Буткевич В.Ф.

Член Закупочной комиссии



Коряков В.Г.

Член Закупочной комиссии



Бабаева Л.Я.

Член Закупочной комиссии




Кочержинский А.Н.

Член Закупочной комиссии



Барков Н.И.

Секретарь Закупочной комиссии



Аелikian Т.М.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ОАО «Тюменьэнерго»


С.В. Смирнов

ПАМЯТКА

Для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.


В ОАО «Тюменьэнерго» разработана, внедрена, функционирует и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», ISO 18001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».

Персонал, выполняющий работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», обязан соблюдать следующие правила:

- Все работы производить в строгом соответствии с действующими процедурами, инструкциями, правилами и нормами;
- Осуществлять сбор и размещение отходов и мусора в специально отведенных для этого местах и контейнерах;
- Не допускать разлива, утечек и протечек нефтепродуктов, лакокрасочных, горюче-смазочных и иных вредных химических веществ, в случае разлива немедленно произвести очистку;
- Использовать автотранспорт и строительно-дорожную технику, прошедшие контроль содержания вредных веществ отработанных газов, согласно установленному порядку;
- Не допускать попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тропинки, тротуары и дороги - проводить немедленную их очистку;
- Самостоятельно проводить уборку рабочих мест и территории после окончания работы, обеспечить содержание земельного участка в надлежащем виде;
- Нести ответственность за нарушение почвенно-растительного слоя вне границ земельного отвода и загрязнение территории производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами;
- Работники обязаны соблюдать правила промышленной и пожарной безопасности, выполнять требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда;
- Не допускать к выполнению работ в электроустановках работников, не ознакомившихся с перечнем потенциальных опасностей при выполнении работ на объектах ОАО «Тюменьэнерго», не прошедших обучение, инструктаж, стажировку, проверку знаний, обязательные медицинские осмотры;
- Перед началом работы персонал должен быть обеспечен всеми необходимыми сертифицируемыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, обучен правилам применения средств защиты и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности труда;

- Весь персонал должен быть обучен безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, должен быть обеспечен инструкциями по охране труда по видам выполняемых работ;
- Исполнитель (подрядчик) обязан соблюдать действующие стандарты и требования ОАО «Тюменьэнерго» установленные в области охраны окружающей среды и в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда;
- Исполнитель (подрядчик) в ходе работы не вправе выполнять указания ОАО «Тюменьэнерго», если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Персонал ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, которые выполняют работы на оборудовании ОАО «Тюменьэнерго», несет ответственность за выполнение перечисленных выше правил.

Начальник СОТ и ПК _____  С.М. Пауесов

Начальник отдела
охраны окружающей среды _____  Е.Н. Каранкевич

Начальник СМК _____  А.В. Маркин

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

1. Электротравма.
2. Поражение электродугой.
3. Воздействие движущихся механизмов.
4. Воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся изделий, заготовок, материалов, предметов.
5. Подвижные части станков, инструмента, оборудования.
6. Неблагоприятные погодные условия.
7. Повышенный уровень шума.
8. Повышенный уровень вибрации.
9. Движение а/т техники (в том числе дорожно-транспортные происшествия).
10. Падение с высоты.
11. Падение предметов, материалов с высоты.
12. Воздействие химических веществ (указать конкретно, какое вещество).
13. Воздействие биологических опасных и вредных веществ (указать конкретно, какое вещество).
14. Воздействие запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны.
15. Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
16. Эмоциональные перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).
17. Физические перегрузки (статические, динамические).
18. Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых.
19. Падение на скользких поверхностях.
20. Недостаточная освещенность.
21. Неионизирующие электромагнитные излучения.
22. Острые кромки и заусенцы.
23. Утопления.
24. Пожары.
25. Повреждения технологического оборудования, зданий и сооружений.
26. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.

Ознакомление с настоящей Памяткой проводится по общепринятому порядку: под личную подпись в «Журнале инструктажа на рабочем месте».

От Заказчика:

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

А.Э. Бурка




согласовано с сетевым отделом курсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

От Подрядчика:

Директор филиала
ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-СУРГУТ»

А.В. Полтораков



Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЛ И ПС ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»**

Потенциальная опасность	Воздействие на человека
Электротравма	Ожоги; Нарушение деятельности нервной системы; Электрический шок
Поражение электродугой	Ожоги
Неблагоприятные погодные условия	Ожог; Перегрев/тепловой удар; Переохлаждение; Обморожение
Движение а/т техники (в т.ч. дорожно-транспортные происшествия)*	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Воздействие движущихся механизмов	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Воздействие разлетающихся материалов, предметов	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение с высоты	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение предметов и материалов с высоты	Раздавливание органов и частей тела; Ранения; Переломы костей и вывихи; Ушибы;
Падение на скользких поверхностях	Переломы костей; Ушибы;
Недостаточная освещенность	Переломы костей, вывихи; Ушибы; Ранения; Ухудшение зрения Переутомление
Острые кромки и заусеницы	Ранения
Повышенный уровень шума	Физиологические расстройства
Повышенный уровень вибрации	Неврологические или сосудистые расстройства
Воздействие химических веществ (лакокрасочные материалы, растворители)*	Отравления; Ожоги; Удушья
Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений	Ожоги; Повреждения сетчатки глаза («зайчики»)

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Физические перегрузки	Растяжение, деформация органов Переутомление
Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых	Неврологические расстройства Аллергическая реакция организма
Пожары	Ожоги; Отравления; Удушение Ранения тела; Ушибы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ПОДСТАНЦИЯХ ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

Опасность	Воздействие на человека
Электротравма	Ожоги Нарушение деятельности нервной системы Электрический шок
Поражение электродугой (при выполнении работы на оборудовании подстанций)	Ожоги
Неблагоприятные погодные условия	Ожоги Перегрев/тепловой удар Переохлаждение Обморожение
Воздействие движущихся механизмов	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Воздействие разлетающихся материалов, предметов	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Подвижные части инструмента, оборудования	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы
Падение с высоты	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей Ушибы
Падение предметов, материалов с высоты	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей Ушибы
Падение на скользких поверхностях	Переломы костей Ушибы
Повышенный уровень шума	Физиологические расстройства
Повышенный уровень вибрации	Неврологические или сосудистые расстройства

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети


Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Недостаточная освещенность	Переломы костей, вывихи Ушибы Ранения Ухудшение зрения Переутомление
Острые края и заусенцы	Ранение
Воздействие химических веществ (Трансформаторное масло, лако – красочные материалы, растворители, электролит, соляная кислота)	Отравление Ожог Удушение
Повышенный уровень инфракрасного и ультрафиолетового излучений	Ожоги Повреждение сетчатки глаза («зайчики»)
Физические перегрузки (статические, динамические)	Растяжение, деформация органов Переутомление
Клещевой энцефалит, укусы кровососущих насекомых	Неврологические расстройства Аллергические реакции организма
Пожары	Ожоги Отравление Удушение Ранение тела Ушибы
Повреждения технологического оборудования, зданий и сооружений	Раздавливание органов и частей тела Ранение тела Переломы костей и вывихи Ушибы Ожоги Отравление Удушение

От Заказчика:

Директор филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

А.Э. Бурка



От Подрядчика:

Директор филиала
ОАО «ТЭСС» «ТЭСС-СУРГУТ»

А.В. Полтораков



согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала ОАО "Тюменьэнерго"
Сургутские электрические сети
_____ Э. Бурка



СОГЛАСОВАНО:

Директор
филиала ОАО «ТЭСС»
«ТОСС СУРГУТ»
_____ А.В. Полтораков



Форма Акта приема-передачи вторсырья

" _____ 2012 г.
от " _____ " _____ 20 _____ г.

Исполнитель работ (Подрядчик)

№	Наименование работ (технологического процесса)	Наименование материала переходящего в отход	Использованный материал		Наименование отхода	Кол-во
			кол-во	ед. изм		т
1	2	3	4	5	6	7
1						
ИТОГО:						

Передал:

(Подрядчик)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Принял:

(Заказчик)

(подпись)

(Ф.И.О.)


Согласовано:

Начальник ПТС _____

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

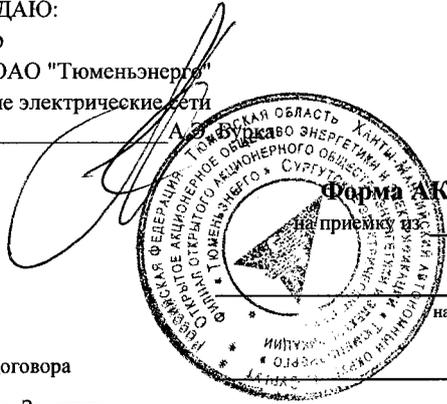

СОГЛАСОВАНО:

Директор
филиала ОАО «ТЭСС»
Сургутские электрические сети



А.В. Полтораков

Форма Акта на приемку из ремонта оборудования

на приемку из _____ ремонта
_____ вид ремонта
_____ установки п/станции № _____
_____ наименование

Дата и № договора _____

Организация-Заказчик _____

Организация-Исполнитель _____

Наименование
объекта/подстанции _____

Комиссия в составе:
_____ председателя

Членов комиссии

_____ должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила акт о нижеследующем:

1. _____ подстанции № _____
_____ наименование установки
находилась в ремонте с _____
при плановых сроках ремонта с _____ по _____ вид ремонта

2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана _____

3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

- 3.1 Ведомость планируемых работ
- 3.2 Ведомость невыполненных работ
- 3.3. Ведомость дополнительных/скрытых работ не предусмотренных планом

4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с _____

_____ наименование протоколов приемо-сдаточных испытаний

отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, установлены следующие оценки качества:

Наименование оборудования (составных частей)	п/станц.	Тип	Оценка качества отремонтированного	Причины изменения оценки качества отремонтированного оборудования
	№			

Согласовано: секретарь конкурсной/закупочной
комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети

5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок качества отремонтированного оборудования, отремонтированная установка принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой _____.

6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в состав установки предприятиям - исполнителям ремонта за качество выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки:

Наименование предприятия-исполнителя ремонта	Оценка качества выполненных ремонтных работ			Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ

7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены остановки оборудования и выполнены следующие работы:

Наименование оборудования	п/станц. №	Тип	Перечень работ	Продолжительность останова

На основании изложенного отремонтированный объект принимается из ремонта в эксплуатацию без ограничений/с ограничениями.

Председатель комиссии

подпись

расшифровка

Члены комиссии:

подпись

расшифровка

подпись

расшифровка

согласовано: секретарь конкурсной/закупочной комиссии филиала ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

Договор
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Сургутские электрические сети
