

Договор № _____

на создание и модернизацию точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Южного территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

г. Сургут

«___» _____ 20__ г.

ОАО «Тюменьэнерго», в лице _____, действующего на основании _____ от «___» _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке заявок и выбору победителя на основании Протокола о результатах открытого одноэтапного конкурса № _____ от «___» _____ 201__ г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Южного территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети (далее - филиал) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора).

1.2 По настоящему договору Подрядчик принимает от Заказчика оборудование и материалы в соответствии с техническим заданием (Приложение №7 «Перечень оборудования и материалов передаваемого Заказчиком Подрядчику» Приложения № 1 настоящего Договора).

1.3 Обязательства по договору выполняются на Объектах Заказчика (далее – «Объекты»), указанных в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора).

1.4 Обязанности Заказчика по Договору исполняются филиалом ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

2. Цена Договора

2.1 Цена Договора определена на основании Протокола о результатах открытого одноэтапного конкурса № _____ от «___» _____ 20__ г., предусмотрена сводным сметным расчетом (Приложение №3 к Договору), и составляет _____ (сумма прописью) рублей __ копеек, кроме того НДС 18% - _____ (сумма прописью) рублей __ копеек. Итого с НДС (18%) _____ (сумма прописью) рублей __ копеек.

2.2 Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению своих обязательств по настоящему Договору, в том числе транспортные расходы, а также обеспечение работ по Договору оборудованием, материалами и программным обеспечением.

2.3 Цена Договора и объём выполняемых работ могут быть изменены после согласования типового проектного решения и оформляются отдельным дополнительным соглашением к Договору.

3. Условия платежей и порядок расчетов

3.1 Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику пакета документов по каждому Объекту:

- Акта приемки выполненных работ формы N КС-2;

_____ «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

- Справки о стоимости выполненных работ формы N КС-3;
- Товарных накладных формы ТОРГ-12;
- Актов о приеме – поступлении оборудования на склад формы N ОС-14;
- Счетов-фактур, оформленных в соответствии с положениями ст.169 Налогового Кодекса РФ, не позднее 5 календарных дней, после выполнения работ по каждому из Объектов;
- Акта о приемке - сдаче выполненных работ по форме (Приложение №7 настоящего Договора);
- Накладная о приеме передачи проектных работ.

В случае, если Подрядчик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

3.2 В течение 35 рабочих дней с даты подписания Сторонами вышеперечисленных документов Заказчик производит расчет с Подрядчиком.

3.3 Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.4 Дополнительные расходы Подрядчика связанные с увеличением срока выполнения работ Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, специализированного программного обеспечения с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны субподрядчиков, других контрагентов Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1 Работы по настоящему Договору должны проводиться в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 настоящего Договора).

4.2 По согласованию между сторонами сроки выполнения работ по Договору могут быть изменены путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1 При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

5.1.1 Обеспечить:

- производство работ в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД, СНиПы, циркуляры и др.), действующей в период производства работ;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных на Объектах Заказчика при приемке работ в сроки, согласованные с представителем Заказчика.

5.1.2 Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.3 Соблюдать требования Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на Объектах ОАО «Тюменьэнерго».

5.1.4 Обеспечить соблюдение персоналом подрядных и субподрядных организаций:

- правил внутреннего трудового распорядка, установленных Заказчиком;
- нормативных требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

5.1.5 В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с «Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов».

5.1.6 Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.7 В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику не позднее дня, следующего за днем замены представителя.

5.1.8 Организовать планирование и координирование работ по Договору.

5.1.9 Осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

5.1.10 Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ по Договору.

5.1.11 Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору в необходимом количестве оборудованием, специализированным программным обеспечением, материалами, комплектующими изделиями, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего выполнения работ.

5.1.12 Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы на оборудование, программное обеспечение, материалы, комплектующие изделия в полном объеме ежемесячно, в сроки предусмотренные Календарным планом.

5.1.13 Немедленно известить представителя Заказчика о независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.14 В случае невыполнения Календарного плана (Приложение № 2 настоящего Договора) по причине нарушения требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов, регламентов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности со стороны Подрядчика (субподрядчика) скорректировать по соглашению с Заказчиком Календарный план (Приложение № 2 настоящего Договора), компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком.

5.1.15 Выполнить обязательства по договору в объемах и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.16 Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, комплектующих изделий, оборудования, на территории места выполнения работ.

5.1.17 Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Заказчику оборудования, материалов, комплектующих, программного обеспечения с предоставлением сертификатов соответствия в необходимых случаях.

5.1.18 Подрядчик обязан в согласованные сторонами сроки, с составлением соответствующего акта, подписываемого сторонами, проверить качество оборудования,

комплектующих и материалов, переданных Заказчиком для проведения работ по настоящему Договору.

5.1.19 Обеспечить:

- согласование с Заказчиком места временного хранения всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;

- осуществление сбора и временного накопления отходов.

В десятидневный срок после окончания выполнения работ по Объекту освободить места проведения работ от отходов, сдать все временно-хранящиеся отходы специализированным предприятиям.

Право собственности на отходы, за исключением вторичного сырья, принадлежит Подрядчику. При этом право собственности на вторичное сырье (в том числе, но не ограничиваясь, лом цветных металлов, отработанное трансформаторное масло) принадлежит Заказчику. Подрядчик передает после выполнения работ по Объекту вторичное сырье на основании соответствующего Акта.

5.1.20 По окончании работ на каждом Объекте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора, вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные сооружения.

5.2 В случае использования при выполнении работ материалов Заказчика Подрядчик должен принять по унифицированной форме М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону». Передача материалов и оборудования Заказчика не является Объектом налогообложения по НДС, поэтому Заказчик не начисляет НДС при передаче материалов, а Подрядчик соответственно не имеет права на вычет». Полученные Подрядчиком от Заказчика материалы являются собственностью Заказчика (ст. 220 ГК РФ).

5.3 По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, где в справочном разделе «Материалы заказчика» отражаются материалы Заказчика с указанием их наименования, количества и стоимости. Перед строкой «Итого» делается запись «За минусом стоимости материалов заказчика» с указанием сметной стоимости используемых материалов при выполнении указанных работ в акте работ. В сумму «Итого» по акту формы КС-2 стоимость израсходованных материалов не включается. Таким образом, материалы не формируют стоимость выполненных подрядчиком работ, а используются для целей расчета лимитированных затрат. К акту выполненных работ Подрядчик прилагает отчет о расходе материалов Заказчика по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Договору. В форме КС-3 перечень и стоимость материалов не приводится.

5.4 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 дней до даты заключения настоящего договора; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров с указанием доли владения в процентах (для акционерных обществ), выданный не ранее, чем за 30 календарных дней до даты заключения настоящего договора; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/ участников) об избрании исполнительного органа), а также о персональных данных руководителей, учредителей, участников, акционеров: (паспорт (иной документ, содержащий паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан, место регистрации) физического лица, удостоверенный подписью уполномоченного лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (ИНН) или иной документ, содержащий ИНН физического лица, удостоверенный подписью

Согласовано:

секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Маркел И.В.

уполномоченного лица, согласие на обработку персональных данных, подписанные вышеуказанными лицами в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»).

5.5 Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в состав собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий документов, подтверждающих произошедшие изменения.

5.6 Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан письменно согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении Договоров с Субподрядчиками.

5.7 Подрядчик несет полную ответственность за действия и бездействие привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ по настоящему договору.

5.8 Все распоряжения и указания Заказчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе о приостановлении работ Подрядчиком, являются обязательными для Подрядчика и должны быть оформлены в письменном виде.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1 Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1.1 Контролировать соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности персоналом Подрядчика (субподрядчика) и принимать действенные меры к нарушителям вплоть до отстранения бригады от работы.

6.1.2 Осуществить финансирование работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с Разделами 2 и 3 настоящего Договора.

6.1.3 В течение 10 календарных дней после подписания настоящего Договора назначить приказом своих Представителей, уполномоченных выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся технической части настоящего Договора.

6.1.4 Задачи, функции, полномочия Представителей Заказчика определяются условиями настоящего Договора.

6.1.5 Производить допуск Подрядчика и его подрядных организаций для выполнения обязательств, принятых, по настоящему Договору на места производства работ в порядке, принятом для выполнения работ на действующем энергетическом оборудовании и в соответствии с правилами внутриобъектного режима.

6.1.6 Обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика при выполнении работ в соответствии с действующими нормативными и техническими документами.

6.2 При отпуске материалов Подрядчику, Заказчик должен выписать в двух экземплярах накладную по унифицированной форме М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».

6.3 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом месте нахождения Подрядчика, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п., упущенная выгода при этом не возмещается.

6.4 Заказчик вправе при нарушении работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору, требований действующих нормативных документов по охране труда,

промышленной и пожарной безопасности отказаться от их дальнейшего допуска на Объекты Заказчика.

7. Сдача-приемка работ

7.1 Представитель Заказчика, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов, комплектующих, оборудования, программного обеспечения условиям Договора и Типовым техническим решениям. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

7.2 Между представителем Заказчика и Подрядчиком могут, при необходимости, проводиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.3 Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки Объектов комплект документации согласно Техническому заданию (Приложение № 1 настоящего Договора) в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (формат согласуется с Заказчиком). Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

7.4 Приемка результата выполненных по Договору работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Представителями Заказчика и Подрядчика, в течение 14 дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об окончании работ. По результатам работы приемочной комиссии Представитель Заказчика принимает от Подрядчика отчетные документы и Акт выполненных работ, по форме КС-2.

7.5 Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется при полном окончании работ на каждом Объекте в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 настоящего Договора) не позднее 25 числа текущего месяца. Подрядчик оформляет и передает на проверку, визирование и подписание в филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети следующие документы:

7.5.1 Первичные учетные документы по выполненным работам на строительно-монтажные работы (СМР):

а) Акт о приемке выполненных работ форма N КС-2 в 4 экземплярах. Акт проверяется и подписывают уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (Заказчика и Подрядчика). Подрядчик: визирует производитель работ (подпись директора и печать). Заказчик: визируют кураторы (подпись директора Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети и печать Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети);

б) На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма N КС-3 - 5 экземпляров. Подрядчик: визирует (подпись директора и печать), Заказчик: уполномоченные лица проверяют оформление документа и визируют (подпись директора Филиала и печать Филиала);

в) Счет - фактура установленного образца - 1 экземпляр.

7.5.2 Первичные учетные документы основных средств (оборудование требующее монтажа):

а) Для оформления и учета поступившего на склад оборудования требующего монтажа, оформляется Акт о приеме (поступлении) оборудования форма N ОС-14 - 2 экземпляра. Документ составляется комиссией, уполномоченной на прием основных средств, утверждается руководителем Филиала или уполномоченным им лицом;

б) Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж форма N ОС-15 - 2 экземпляра. Документ составляется приемочной комиссией с представителем Подрядчика, в получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель Подрядчика расписывается непосредственно в акте и ему передается копия акта;

в) Товарная накладная по форме ТОРГ-12 - 2 экземпляра;

г) Счет – фактура установленного образца – 1 экземпляр.

7.5.3 Первичные учетные документы по приемке – сдаче проектных работ:

а) Акт о приемке - сдаче выполненных работ по форме (Приложение №7 настоящего Договора) в 4 экземплярах. Акт проверяется и подписывают уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (Заказчика и Подрядчика). Подрядчик: визирует производитель работ (подпись директора и печать). Заказчик: визируют кураторы (подпись директора Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети и печать Территориально производственного отделения филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети);

б) Накладная о приеме передачи проектных работ в 2 экземплярах;

в) Счет – фактура установленного образца – 1 экземпляр.

7.6 Результаты работы Подрядчика, в которых Заказчик обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Заказчика.

Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, а также выявление факта использования Подрядчиком некачественных запасных частей, комплектующих и материалов, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия, фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.

7.7 Если Подрядчик не предоставит свои замечания по предоставленному Заказчиком акту о выявленных недостатках в течение 10 дней, акт считается принятым в редакции Заказчика.

7.8 Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, без увеличения стоимости работ.

7.9 В случае если Подрядчик в назначенный срок не устранил выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь другого подрядчика для их устранения. При этом, все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 дней с момента получения копии документов, подтверждающих затраты Заказчика по устранению недостатков.

7.10 Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вносит изменения (дополнения) в техническое задание, а так же внесение корректировок по требованию инспектирующих организаций, когда необходимость в них возникла не по вине Подрядчика, влекущие за собой увеличение стоимости работ, то эти работы выполняются Подрядчиком на основании дополнительного соглашения и оплачиваются дополнительно.

7.11 ТМЦ не использованные Подрядчиком, возвращаются Заказчику по накладной М-15 в течение 30 календарных дней после подписания Акта о приемке - сдаче выполненных работ по последнему Объекту.

8. Гарантии качества по выполненным работам

8.1 Подрядчик гарантирует, что качество материалов, комплектующих изделий, оборудования, программного обеспечения применяемых им для выполнения работ, а так же самих выполненных работ на Объекте, будут соответствовать требованиям, указанным в технической программе, государственным стандартам,

Согласовано
секретарь приемочной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2 Гарантии качества распространяются на все оборудование, материалы, комплектующие изделия, программное обеспечение и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации систем учета электроэнергии и входящих в нее оборудования, материалов, комплектующих изделий, программного обеспечения и работ, выполненных Подрядчиком на Объекте, составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2 по Объекту.

8.4 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты в оборудовании, материалах, комплектующих изделиях, программном обеспечении и работах, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, то Подрядчик производит их устранение за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком, или возмещает Заказчику затраты на их устранение. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5 При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках, либо при неявке Подрядчика в срок, установленный в п. 8.4. настоящего Договора, Акт считается принятым в редакции Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору.

9.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия.

9.3 При наступлении указанных в п. 9.2 настоящего Договора обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к извещению справку компетентного государственного органа.

9.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 9.3 настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока действия настоящего Договора на период существования указанных обстоятельств, но не более чем на 3 месяца. В случае существования этих обстоятельств более 3 месяцев любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 дней с момента расторжения настоящего Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

10. Ответственность

10.1 За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2 В случае нарушения Подрядчиком срока начала, либо срока окончания выполнения работ, поставки оборудования, материалов, комплектующих изделий, программного обеспечения по каждому из Объектов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Объекту, за каждый день просрочки.

10.3 За нарушение условий о качестве выполненных работ Подрядчик сверх неустойки возмещает причиненные этим нарушением убытки, в том числе упущенную выгоду.

10.4 В случае обнаружения Заказчиком нарушений в результатах работ в ходе их приемки, в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также выявление фактов использования Подрядчиком некачественных, либо не соответствующих предоставленным сертификатам соответствия оборудования, материалов, запасных частей, комплектующих, программного обеспечения указанные факты фиксируются в Акте о выявленных недостатках, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном п. 8.4 настоящего Договора, с согласованием порядка и сроков их устранения. При выявлении таких фактов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 40% от стоимости работ по соответствующему Объекту. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности устранить недостатки в работе за свой счет.

10.5 В случае отказа Подрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в работе, либо в случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов по устранению выявленных недостатков в работе.

10.6 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение на Объектах Заказчика работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ по Договору Правил технической эксплуатации электрических сетей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности при эксплуатации электроустановок), и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации. В случае выявления факта нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения указанных в настоящем пункте требований подтверждается Актом расследования нарушения, составленным и подписанным Представителями Заказчика и Подрядчика.

10.7 При несогласии Подрядчика подписывать Акт расследования нарушения, последний в двухдневный срок направляет в адрес Заказчика мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа Подрядчика в подписании Акта либо неявки подрядчика для составления Акта, Акт расследования нарушений считается принятым в редакции Заказчика.

10.8 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке предусмотренном п.6.3 настоящего Договора.

10.9 Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.10 Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается финансовым обеспечением в размере _____ руб. (НДС не облагается), которое на момент заключения настоящего договора внесено Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Заказчик вправе возвращать Подрядчику финансовое обеспечение ранее срока выполнения всех обязательств по договору в течение 30 дней после подписания сторонами акта выполненных работ (этапа работ) и отсутствии фактов неисполнения/

ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. Размер части финансового обеспечения, подлежащей возврату Подрядчику, определяется в процентном соотношении к стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

В случае прекращения, расторжения настоящего договора по причинам, не связанным с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику сумму финансового обеспечения (оставшуюся сумму финансового обеспечения), за вычетом ранее выплаченной суммы финансового обеспечения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с даты прекращения, расторжения Договора.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик вправе не возвращать финансовое обеспечение (оставшуюся сумму финансового обеспечения).

11. Рассмотрение споров

11.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством.

12. Конфиденциальность.

12.1 Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

12.2 Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

12.3 Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

12.4 За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

13. Прочие условия

13.1 Переход возникших из настоящего договора прав требований к Заказчику, зачет взаимных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет взаимных, однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.

13.2 Заказчик и Подрядчик вправе изменить объем и технический характер работ, выполняемых по настоящему Договору, при условии, что такие изменения будут взаимно согласованы Сторонами в письменной форме.

13.3 Все изменения связанные с каким-либо уменьшением или увеличением объема работ Подрядчика, стоимость работ будет скорректирована путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

13.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными Представителями сторон.

13.5 Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения к Договору

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный план (форма).

Приложение № 3 – Сводный сметный расчет (форма).

Приложение № 4 – Паспорт – протокол (форма).

Приложение № 5 – Акт приемки точки учета электроэнергии (форма).

Приложение № 6 – Отчет о расходе материалов Заказчика (форма).

Приложение № 7 – Акт о приемке - сдаче выполненных работ (форма).

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

15.1 В случае изменения банковских, почтовых и иных реквизитов Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга. Для Сторон такие изменения становятся обязательными к исполнению со дня их получения.

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Тюменьэнерго»

Ю/а: 628406, Россия, Тюменская обл.,

Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

П/а: 628406, Россия, Тюменская обл.,

Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,

г. Сургут, ул. Университетская, 4

Тел./Факс: (3462) 77-66-77

Электронный адрес: can@id.te.ru

ИНН 8602060185, КПП 997450001

Р/с 40702810267170101719

в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк

России» г. Тюмень

БИК 047102651

К/с 30101810800000000651

ПОДРЯДЧИК:

М.П.

М.П.

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по объектному выполнению работ по созданию и модернизации
точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Южного
территориально производственного отделения
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

[illegible]**ЗАКАЗЧИК:**

ПОДРЯДЧИК:

//

11

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

по объектной стоимости работ по созданию и модернизации
точек учета розничного рынка электроэнергии у потребителей Южного
территориально производственного отделения
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

[illegible]**ЗАКАЗЧИК:**

ПОДРЯДЧИК:

//

//

Согласовано

Утверждаю

_____ 2012 г.

_____ 2012 г.

**ОАО «Тюменьэнерго»
ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ №**

на информационно-измерительный комплекс


Наименование объекта _____

Наименование присоединения № ТП 101

ВЛ: L-I

Оп. № _____

2. Однолинейная электрическая схема присоединения:

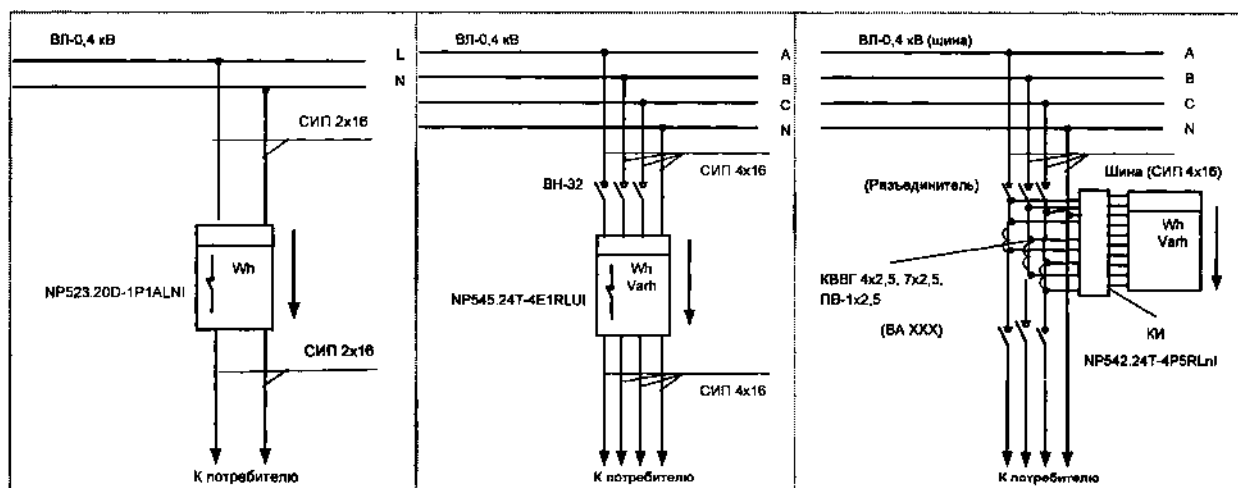

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию: " ____ " _____ 20__ г.

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные

4.1. Счетчики электрической энергии:

вид учета		вид энергии	A/R
тип		Зав.номер	
напряжение		ном. (макс.)ток	
класс точности для Акт. Энергии		класс точности для Реакт. энергии	
количество тарифов		номер в Госреестре	
часы счетчика синхронизируются			
Дата поверки		межповерочный интервал	
Схема включения		номера пломб с указанием организации, поставивших пломбы	

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Мещеряков И.В.

расхождение показаний счетчика по акт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором при нагрузке XX %		расхождение показаний счетчика по реакт. Электроэнергии (в %) с образцовым прибором	
вид механической защиты от несанкционированного доступа		Температурный режим эксплуатации счетчика требованиям технического паспорта (не) соответствует	

Погрешность ИИК (расчетная) (по формуле 3.4 РД 34.09.101-94):

$$\delta = \pm 1,1 \sqrt{\delta_I^2 + \delta_U^2 + \delta_A^2 + \delta_{CH}^2}$$

активная \pm __ %, реактивная \pm __ %.

Составлено:

Должность _____ (подпись) _____ (ФИО) _____

Дата заполнения: « ____ » _____ 20__ г.

Договор ОАО «Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.

к Договору №

АКТ

приемки точки учета электроэнергии

от " " 20 г.

Наименование присоединения	Тип счётчика	Заводской номер счётчика	Текущая дата	Текущее время	P, кВт*ч птр (в лин.)	P, кВт*ч выд (в шины)	Q, кВт*ч птр (в лин.)	Q, кВт*ч выд (в шины)	Дата поверки	Дата выпуска	Класс точности	МПИ, мес
до замены									кв.20 г.			
после замены									кв.20 г.			
Балансовая принадлежность счётчика												

Тип ТТ Данные трансформаторов тока

Тип ТТ

Балансовая принадлежность


фаза	Заводской номер	Ктп	Дата поверки	МПИ, мес	кл.т
A					
B					
C					

Тип ТН Данные трансформаторов напряжения

Тип ТН

Балансовая принадлежность

фаза	Заводской номер	Ктн	Дата поверки	МПИ, мес	кл.т
A					
B					
C					

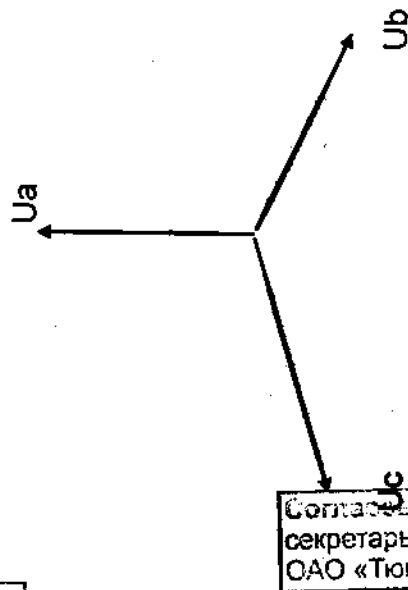

Векторная диаграмма

Ток, угол φ	φ.A	φ.B(N)	φ.C
I1, A			
I2, A			
угол φ, град			

Заключение Произведена приёмка учёта эл.энергии после замены электрического счётчика.
Учёт принят.

Представитель потребителя:

Представитель ОАО "Тюменьэнерго"

Представитель Подрядчика:

(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

(Наименование предприятия) (Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

Утверждаю

201 г.

Заказчик: _____
адрес предприятие _____

Подрядчик: _____
наименование организации (адрес предприятия)

Стройка: _____

Объект: _____
наименование объекта по договору
договор подряда (контракт)

о расходе материалов Заказчика

32 _____ 201 г.

к акту формы КС-2 № _____ от _____ 201 г.

№ п.п.	Номер позиции по акту формы КС-2	Наименование (вид) работ, при выполнении которых использованы давальческие материалы	Наименование израсходованных давальческих материалов (тип, марка)	Ед. изм.	Кол-во израсходованных материалов	
					по норме	фактически
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО						

Подписи представителей

Должность

Роспись

Должность

Роспись

«Юменьэнергос»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Мархов И.В.

Согласовано

Утверждаю

_____ 201__ г.

_____ 201__ г.

Акта о приемке - сдаче выполненных работ
«__» _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика _____, с одной стороны, и представитель Заказчика _____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что по договору от __.__.201__ г. № _____ Подрядчиком выполнены следующие работы:

Наименование работ (этапы работ)	Наименование объекта	Инвентарный номер	Стоимость, руб.	НДС 18%, руб.	Стоимость, руб. с НДС

Сдал:

Принял:

_____ 201__ г.

_____ 201__ г.

г.

«Тюменьэнерго»

Согласовано:
секретарь конкурсной комиссии
ОАО «Тюменьэнерго» Марков И.В.
